



AI Product & Project Management

AICB-P1 · Ngày 6 · Quản lý sản phẩm AI như thế nào?

Tên Giảng Viên

VinUniversity · Phase 1 · Tuần 1 · 2026

HÃY SUY NGHĨ...

“Team đã build 3 tuần. Nhưng stakeholder muốn đổi requirements. Làm sao xử lý?”

Giữ câu hỏi này trong đầu khi học bài hôm nay

1. Agile / Scrum cho dự án AI
2. MVP first và MVE
3. Low-code / no-code cho PoC
4. PoC với stakeholder

5. ROI analysis cho AI projects
6. Stakeholder communication
7. Hands-on 6 + pitch deck
8. Assessment cuối buổi

- Hiểu cách quản lý dự án AI trong điều kiện **uncertainty cao**
- Biết cách dùng **Agile + hypothesis-driven delivery** thay vì plan cứng
- Chọn đúng mức đầu tư giữa **MVE, MVP**, và **PoC**
- Tính được **ROI** có cơ sở và trình bày được với stakeholder

Cuối buổi này, học viên phải hoàn thiện được: **PRD final, ROI model 3-6-12 tháng, và pitch deck 5-7 slides.**

PRD final + ROI spreadsheet / model + stakeholder slide deck + 5 phút pitch rehearsal

- Dừng lại product đã xác lập ở Day 05
- ROI phải có kịch bản **conservative / realistic / optimistic**
- Pitch deck phải đủ rõ cho stakeholder quyết định **go / pilot / no-go**

Agile Cho AI Projects

AI project management hiệu quả = Agile cộng scientific method, không phải timeline cứng



- Chất lượng đầu ra phụ thuộc vào dữ liệu, prompt, tool reliability, và user behavior nên **unknowns** nhiều hơn software thường.
- Nhiều giả định chỉ được kiểm chứng sau khi có prototype hoặc sau vài vòng eval thực tế.
- Requirement cho AI thường cần **calibration** chứ không chỉ implementation.

Lưu ý: Nếu team đối xử với AI project như một backlog feature thông thường, họ sẽ đánh giá sai effort, sai risk, và sai Definition of Done.



Mỗi sprint phải trả lời: **đã học được gì, giả định nào bị bác bỏ, và tiếp tục đầu tư hay dừng ở đâu.**

Loại việc	Sai lầm thường gặp	Cách ước lượng thực dụng
Prompt / behavior tuning	coi như task nhỏ cố định	thêm buffer cho iteration và eval
Tool integration	chỉ tính phần code	tính cả error handling và re-tries
Data / retrieval work	chỉ tính setup ban đầu	tính thêm cleaning, coverage, edge cases
UX / trust calibration	bỏ quên hoàn toàn	dành sprint time cho test với user thật

Unknowns must be priced in

- Không chỉ là “**code chạy**”; phải có **quality threshold, latency, fallback**, và **monitoring signal**.
- Ví dụ: support agent chỉ được xem là done khi citation coverage đủ, escalation path rõ, và test set đạt ngưỡng.
- Backlog AI nên nhìn cả **feature debt, data debt**, và **technical debt**.

MVP First

Validate value trước khi đầu tư lớn vào implementation và tích hợp

02

Mức	Mục tiêu chính	Câu hỏi cần trả lời
MVE	test giả định giá trị nhanh nhất	user có thật sự muốn thứ này không?
MVP	ship phiên bản nhỏ có thể dùng được	workflow có vận hành được không?
PoC	giảm bất định cho stakeholder / sponsor	có đáng đầu tư thêm không?

Đừng dùng 3 từ này lẫn lộn. Nếu mục tiêu là học nhanh, hãy ưu tiên **MVE**. Nếu mục tiêu là xin phê duyệt tiếp, hãy thiết kế **PoC**.

Khi nào nên dùng

- Chưa chắc user value có thật
- Chưa cần đầu tư model / integration lớn
- Muốn test workflow hoặc adoption risk sớm

Ví dụ

- “AI support agent” nhưng backend thật ra là human draft response
- “AI sales assistant” nhưng qualification do BA làm thủ công phía sau

Lưu ý: Wizard of Oz không phải “giả vờ để lừa user”. Nó là cách kiểm chứng **value và workflow** trước khi đầu tư sâu vào hệ thống.

- Mỗi thử nghiệm cần có **giả định**, **thời hạn**, **budget ceiling**, và **tiêu chí dừng**.
- Ví dụ: “Trong 2 tuần, test internal policy assistant cho 20 câu hỏi lặp lại; nếu time-to-answer không giảm đáng kể, dừng.”
- Đầu tư nhỏ nhưng học nhanh tốt hơn đầu tư lớn rồi mới biết không có user value.

Low-code / No-code Cho PoC

Dùng đúng mức để validate ý tưởng nhanh, không thay thế mọi quyết định sản phẩm

Assistants API

Phù hợp: PoC nhanh với tool calls cơ bản

Giới hạn: chưa thay cho architecture production

Dify

Phù hợp: demo workflow, RAG, và app UI nhanh

Giới hạn: không giải hết bài toán enterprise phức tạp

LangFlow

Phù hợp: giải thích flow agent theo cách trực quan

Giới hạn: không thay cho product discovery đầy đủ

Low-code nên được dùng để **demo nhanh, kiểm chứng workflow, và hỗ trợ PoC**; không nên thay cho product discovery hay production planning.

- Khi cần **stakeholder demo** trong thời gian ngắn
- Khi muốn test **workflow fit** trước khi team engineer build sâu
- Khi muốn minh họa rõ user journey và điểm gãy của experience

Low-code giúp validate nhanh, nhưng không thay thế việc viết **PRD rõ, risk register rõ, và success metrics rõ**.

PoC Với Stakeholders

PoC tốt phải giảm bất định, không phải tạo cảm giác
“trông có vẻ thông minh”



Ô cần chốt	Nội dung
Key hypothesis	giả định giá trị hoặc feasibility cần kiểm chứng
Scope	1 workflow hẹp, 1 nhóm user hẹp, 1 bộ dữ liệu hẹp
Success criteria	metric đo được, chốt trước với stakeholder
Timebox	2-4 tuần, có điểm review rõ
Next decision	nếu đạt / không đạt thì làm gì tiếp

PoC nên làm

- giảm bất định chính
- đo giá trị ban đầu
- kiểm chứng workflow hẹp

PoC không nên làm

- ôm toàn bộ scope tương lai
- hứa production readiness
- dùng demo đẹp để che metric yếu

ROI Analysis

ROI cho AI phải có số cụ thể, giả định rõ, và timeline rõ

05

Thành phần	Cost side	Value side
Build	dev effort, setup, integration	launch nhanh hơn, tạo năng lực mới
Run	API cost, compute, storage	throughput cao hơn, bớt việc tay
Operate	human review, monitoring, maintenance	giữ chất lượng, giảm rủi ro
Business impact	—	time saved, revenue, cost avoidance

ROI starts with anatomy, not optimism

Conservative

adoption chậm
cost cao hơn
value thấp hơn


Realistic

baseline hợp lý
dựa trên pilot
và benchmark nội bộ

Optimistic

adoption tốt
workflow fit cao
ít friction hơn dự kiến

Stakeholder cần thấy phạm vi kết quả có thể xảy ra, không chỉ một con số đẹp duy nhất.

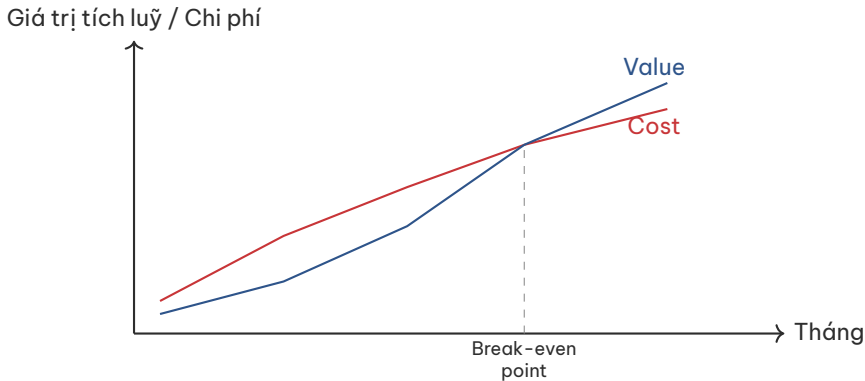

Dự án đạt break-even ở tháng nào, dưới kịch bản nào, và giả định nào có thể đẩy mốc này ra xa hơn?

- Tránh nói chung chung như “AI sẽ giúp hiệu quả hơn”.
- Nói bằng cấu trúc: **baseline hôm nay** -> **giả định thay đổi** -> **giá trị 3-6-12 tháng** -> **điều kiện để giá trị xảy ra**.
- Luôn nêu rõ các giả định nhạy cảm nhất: adoption rate, review cost, API cost, error handling cost.

Stakeholder Communication

Cùng một sản phẩm nhưng technical audience và executive audience cần hai cách trình bày khác nhau

Audience		Quan tâm chính	Nên nhấn mạnh
Technical team		architecture, eval, risks, dependencies	scope, flow, Definition of Done
Executive sponsor	/	ROI, timeline, adoption, risk exposure	business value, scenario, decision ask

- Cần nói rõ AI làm tốt điều gì, chưa làm tốt điều gì, và cần human review ở đâu.
- Khi stakeholder hiểu sai capability, team sẽ bị áp scope không thực tế.
- Communication tốt giúp giảm kỳ vọng ảo và tăng cơ hội dự án sống sót lâu hơn.

1. Problem / pain point
2. Target user và current workflow
3. Proposed AI solution
4. Metrics và expected value
5. ROI / 3-scenario view
6. Risks + mitigation
7. Decision ask: go / pilot / no-go

Thực Hành

Day 06 chốt từ tài liệu sang đề xuất đầu tư có thể trình bày được

07

1. Hoàn thiện **PRD final** từ Day 05.
2. Lập **ROI model 3-6-12 tháng** với 3 kịch bản.
3. Chuẩn bị **stakeholder deck 5-7 slides**.
4. Rehearsal **5 phút pitch**: một người trình bày, một người đóng vai sponsor hỏi lại.

Lưu ý: Lab này chấm theo mức độ **rõ quyết định, rõ giả định, và rõ điều kiện để tiếp tục đầu tư**.

- **PRD final:** đủ scope, metrics, risks, go-forward logic
- **ROI sheet:** có cost side, value side, break-even, 3 scenarios
- **Pitch deck:** gọn, logic, nói được với stakeholder không kỹ thuật
- **5-min pitch:** trình bày được decision ask rõ ràng

Những ý chính cần nhớ trước khi sang bài tiếp theo

- 1 AI project management hiệu quả là Agile cộng scientific method: thử, đo, học, rồi mới đầu tư tiếp.
- 2 MVP first và PoC đúng nghĩa giúp team validate value trước khi commit quá nhiều thời gian và chi phí.
- 3 ROI cho AI phải có số cụ thể, giả định rõ, và timeline rõ; không thể chỉ nói “AI sẽ tốt hơn”.
- 4 Stakeholder communication quyết định dự án có được tiếp tục đầu tư hay không, không chỉ chất lượng prototype.

Data Foundations – Embedding & Vector Store

“Bạn đã có PRD, ROI, và câu chuyện để xin đầu tư. Nhưng agent của bạn sẽ biết gì nếu không có dữ liệu riêng? Ngày tiếp theo: đưa dữ liệu vào hệ thống AI như thế nào.”

- Rà lại pitch deck và chỉ ra 2 giả định ROI nhạy cảm nhất
- Chuẩn bị 1 nguồn dữ liệu nội bộ giả định để nghĩ về bài toán retrieval ngày mai

- 1 Stanford HAI. *AI Index Report 2025*. hai.stanford.edu
- 2 McKinsey Global Institute. *The Economic Potential of Generative AI*. mckinsey.com
- 3 Dify Docs. *Build LLM Apps with Low-code / No-code*. docs.dify.ai

Hỏi & Đáp

Bạn đang quản lý một AI project, hay đang quản lý một tập giả định chưa được kiểm chứng?



Cảm ơn!

Email: lecturer@vinuni.edu.vn

Slides & tài liệu: github.com/aicb-vinuni

Lab template: bit.ly/aicb-day06-lab
